

2024 年上半年信息系统项目管理师考试案例分析真题

（第二批次）

1、

【考生回忆版】

【说明】

某海关拟建设电子人工智能平台，采用光学字符识别技术（OCR），将多语种报关单、身份证件等文件转为电子文档，以提高报关效率。

项目由小张任项目经理，小张初步分析项目需求后，与发起人共同制定了项目章程，章程内容包括：项目目的、项目目标（60 天内提高报关效率）、项目描述、项目边界定义、项目退出标准，拟申请的财务资源、关键用户名单，项目审批要求，项目经理签名、发起人和批准人签名，项目章程获得批准，小张组建了项目团队。

电子订单人工智能平台的建设主要包括六个工作模块，内容和特点如下：

- （1）平台硬件交付：包括人工智能服务器、网络、高拍仪等的采购、搭建、测试等，需求明确、建设方法成熟、要求训练数据到位前交付。
- （2）数据采集和标注：要求数据小组一次性交付 50 万张相关单及身份证件图片及标注结果。
- （3）OCR 模型调试：要求数据小组多次调试并交付模型，精度不断提高，直到实现关务部门认可的效果和性能。
- （4）OCR 算法开发：创新程度高，团队没有同类项目开发经验，3 天就需要更新一次，确保开发方向正确。
- （5）前端界面开发：需要展示界面风格，操作步骤多次向关务部门进行演示，尝试用各种选项澄清范围和需求，在最后完成可接受的全部功能。
- （6）平台操作测试：平台边研发边上线，完成一个功能模块就需要向相关人员提供一次操作或维护培训，在最后一次培训结束后才算完成全部工作。

项目验收时，海关技术的负责人、关务部门代表首次受邀参与项目，在验收评审会中指出了诸多问题，包括平台关键功能不完整、项目计划不合理、算法精度差、识别速度慢等，表示不认可交付成果。

问题内容：

【问题 1】

结合项目案例，请指出项目章程的内容存在哪些缺陷？

【问题 2】

结合项目案例，请帮助小张为六个工作模块选择最适合的开发方法。

- A. 预测型方法
- B. 迭代型方法
- C. 增量型方法
- D. 敏捷型方法

- (1) 平台硬件交付 ()
- (2) 数据采集和标注 ()
- (3) OCR 模型调试 ()
- (4) OCR 算法开发 ()
- (5) 前端界面开发 ()
- (6) 平台操作测试 ()

【问题 3】

- (1) 结合项目案例，请指出小张应让相关干系人参与哪些项目工作，以避免验收阶段出现的问题。
- (2) 有效执行干系人绩效域可以实现哪些预期目标？

【问题 4】

结合案例，判断下列说法的正误（填写在对应栏内，正确的填写“√”，错误的填写“×”）。

- (1) 变更请求必须经过 CCB 的审批。 ()
- (2) CCB 应负责提出合理、可执行的变更方案。 ()
- (3) CCB 由主要干系人共同组成，包括用户单位的相关人员。 ()
- (4) 批准的变更请求不应导致项目管理计划变更。 ()
- (5) CCB 是项目的所有者权益代表。 ()
- (6) CCB 是作业机构，不是决策机构。 ()

2、

【考生回忆版】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将答案填入对应栏内。

【说明】

某市计划建资人工智能计算中心，作为新质生产力的重要抓手，向区域内进行智能化转型的企业提供人工智能算力。该建设项目需要进行设备采购、平台软件采购、网络建设、软件开发等工作，投资额较大。

项目建设主管部门的申请报告被批准后，建设单位对技术可行性、经济可行性、运行环境可行性进行


了细致的研究和分析，但是，可行性研究报告未通过主管部门审批，原因是缺少社会效益可行性分析。

建设单位修改报告后再次提交。由于项目金额较大，主管部门聘请具有相关资质的 A 设计院进一步评估项目可行性，A 设计院评估了项目可行性研究报告，项目关键建设条件和工程的协议文件。由于 A 设计院缺少熟悉人工智能领域的技术专家，设计院总工初步分析了技术可行性分析，认为其技术方案设计比较丰富，项目关键建设条件和工程协议文件比较全面，于是在可行性研究报告上签署了同意，并将其发布为评估报告。

项目立项后，建设单位项目经理老陈为明确项目边界，实施了如下项目范围管理过程，规定项目输出相应文档。

过程	输出文档
规划范围管理	范围管理计划、(1)
收集需求	需求文件、(2)
定义范围	项目文件（更新）、(3)
创建 WBS	项目文件（更新）、(4)
确认范围	验收的可交付成果、变更请求、项目文件（更新）、(5)
控制范围	变更请求、项目管理计划（更新）、项目文件（更新）、(6)

项目经理老陈分解项目工作，形成的完整 WBS 如图所示：

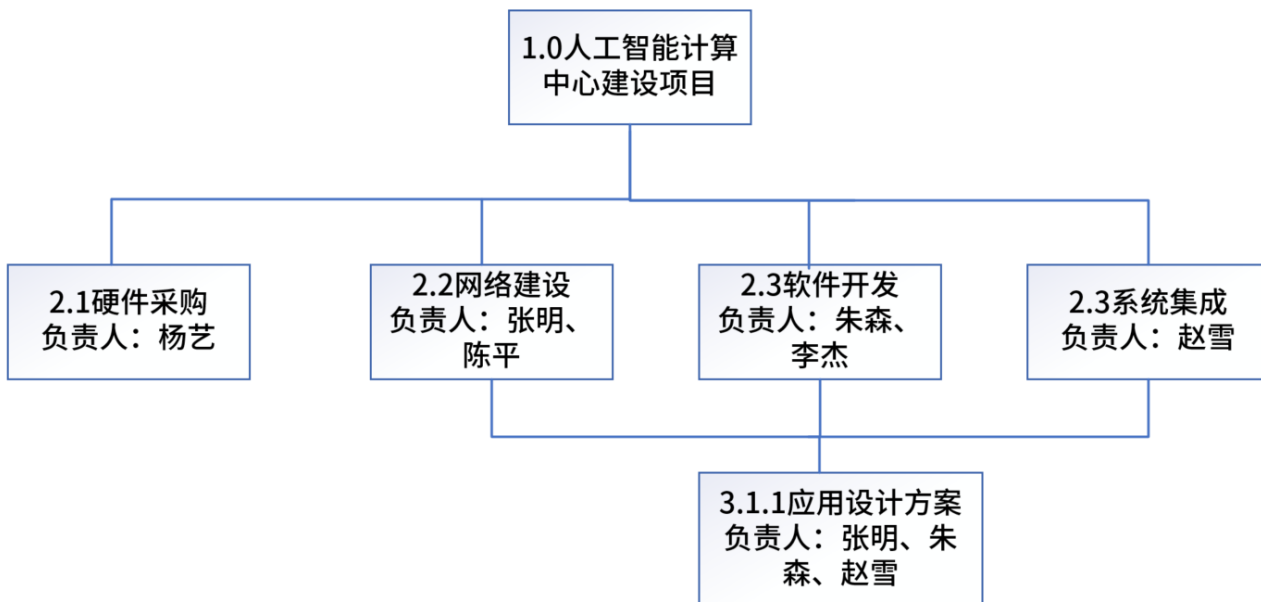

问题内容：

【问题 1】

结合项目案例，请指出可行性研究中，社会效益可行性分析，包含哪些方面的内容？

【问题 2】

结合案例，依据项目评估工作程序，请指出 A 设计院评估过程存在的问题。

【问题 3】请补充项目范围管理各过程输出中缺失的文档。

【问题 4】请指出老陈编制的 WBS 不妥之处。

3、

【考生回忆版】某项目计划工期为 10 个月，预算 210 万元，第 7 个月结束时，项目经理进行了绩效评估，发现实际完成了总计划进度的 70%。项目的实际数据，如表所示：

月份	PV (万元)	AC (万元)
1	30	35
2	50	55
3	70	80
4	90	95
5	110	120
6	130	140
7	150	145
8	170	
9	190	
10	210	

问题内容：

【问题 1】

根据项目数据表，可以确定（1）月份的实际花费最低，仅为（2）万元。

【问题 2】

计算项目第 7 个月底时的 EV、CV、SV 值。

【问题 3】

评估项目第 7 个月底时的绩效，并给出改进措施。

【问题 4】

如果在第 7 个月结束时，找到了影响绩效的原因并纠正了项目偏差，请计算 ETC 和 EAC，并预测此种情况下项目完成时间较原计划提前？落后？不变？

想要了解更多 可以咨询课程顾问

